

REUNIÃO

CONSELHO DO PLANO RIO GRANDE

27 DE NOVEMBRO DE 2025



Plano Rio Grande

Estratégia única de ação



PLANO RIO GRANDE

Todos nós por todos nós.

GOVERNANÇA COMPARTILHADA

**Comitê Gestor
do Plano Rio
Grande**

**Secretaria
Executiva do
Plano Rio
Grande**

(Secretaria da
Reconstrução Gaúcha)

**Conselho do
Plano Rio
Grande**

**Comitê
Científico de
Adaptação e
Resiliência
Climática**

**Comitê Gestor
do Fundo do
Plano Rio
Grande** (Funrigs)

Conselho do Plano Rio Grande

- ✓ **182 representantes** do poder público, sociedade civil e comunidades atingidas.
- ✓ **184 demandas recebidas.**
- ✓ **20 reuniões** com câmaras temáticas.
- ✓ **78 municípios** atendidos desde mai/25 em **115 reuniões** realizadas:
 - 88 internas e 27 externas.



Comitê Científico

COMITÊ CIENTÍFICO DE ADAPTAÇÃO E RESILIÊNCIA CLIMÁTICA

- ▶ **49 especialistas** de 32 instituições.
- ▶ **42 áreas de conhecimento**, reunidas em 4 Núcleos Temáticos Integradores.
- ▶ **Mais de 220 reuniões** (de trabalho, ordinárias e extraordinárias).
- ▶ **189 produtos**: pareceres, publicações e interações com a sociedade.

- ▶ **Acesse aqui os boletins informativos das ações do Comitê Científico:**

sict.rs.gov.br/comitecientifico



PLANO DE INVESTIMENTO

- ▶ **Projetos autorizados e com resolução publicada: R\$ 13.309.892.674,41**
- ▶ **Projetos previstos: R\$ 1.236.418.575,75**
- ▶ **Total: R\$ 14.546.311.250,16 ***

Todos os projetos originalmente previstos no plano de aplicação.

Plano de aplicação aprovado pelo MF



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria do Tesouro Nacional
Subsecretaria de Relações Financeiras Intergovernamentais
Coordenação-Geral das Relações e Análise Financeira dos Estados e Municípios
Coordenação de Relações Financeiras Intergovernamentais
Gerência de Projeções e Estudos Fiscais dos Estados, Distrito Federal e Municípios

CONCLUSÃO

12. Diante do exposto, **constata-se a conformidade do Plano de Investimentos atualizado** com o disposto no § 2º do art. 2º da Lei Complementar nº 206/2024 e § 2º do art. 8º do Decreto nº 12.118/2024.
13. A compatibilidade entre os valores totais da postergação e do Plano de Investimentos está atendida, ambos no montante de R\$ 14.546.311.250,16.

- ▶ **Acesse aqui o Plano de Investimentos:**

[serg-plano-de-investimentos-022025.pdf](#)



* Valor total estimado para os 36 meses de suspensão das parcelas da dívida (jun/24 a mai/25), conforme LC 206/2024.


EXECUÇÃO FINANCEIRA

- ▶ Valor total estimado: **R\$ 14.546.311.250,16**
- ▶ Valor total depositado até nov/25: **R\$ 5.725.189.925,04**
- ▶ Valores pagos: **R\$ 3.316.298.039,54**
- ▶ Saldo financeiro: **R\$ 2.408.891.885,50**

Atenção: é esperado que os pagamentos sejam menores do que os depósitos no primeiro ano, pois os projetos estão em fase inicial.

Todos os recursos serão utilizados até o fim da postergação da dívida com a União, conforme o Plano de Investimento.

Projeção de desembolsos do FUNRIGS

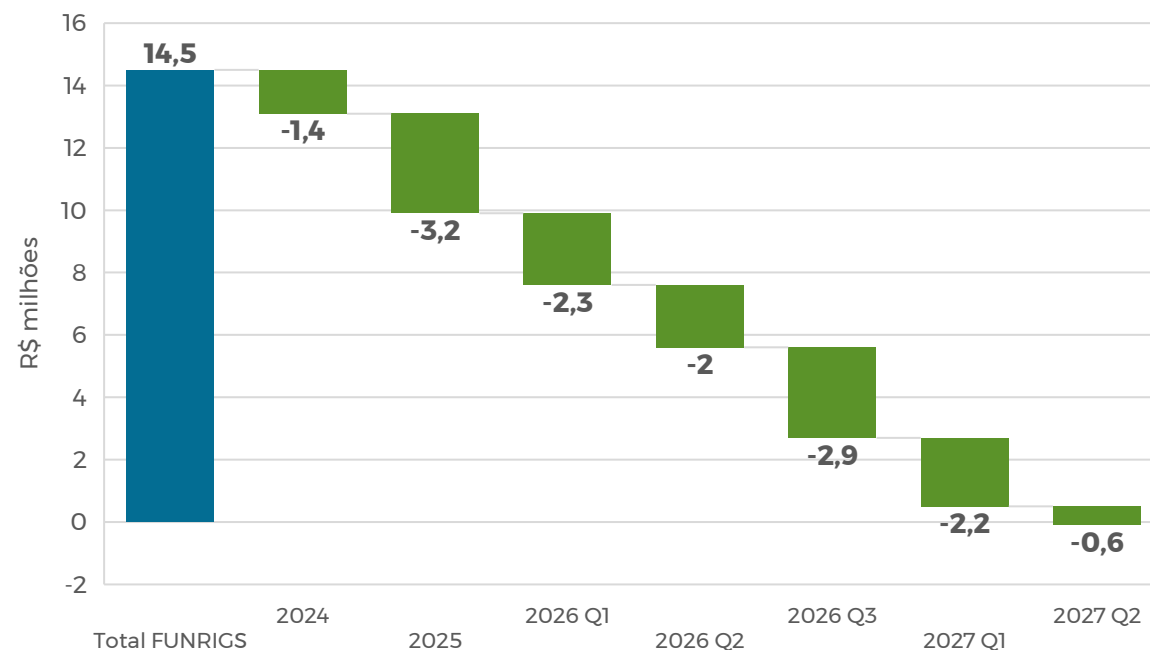


Eixos de ação



PLANO **RIO GRANDE**



Plano de investimentos do Funrigs

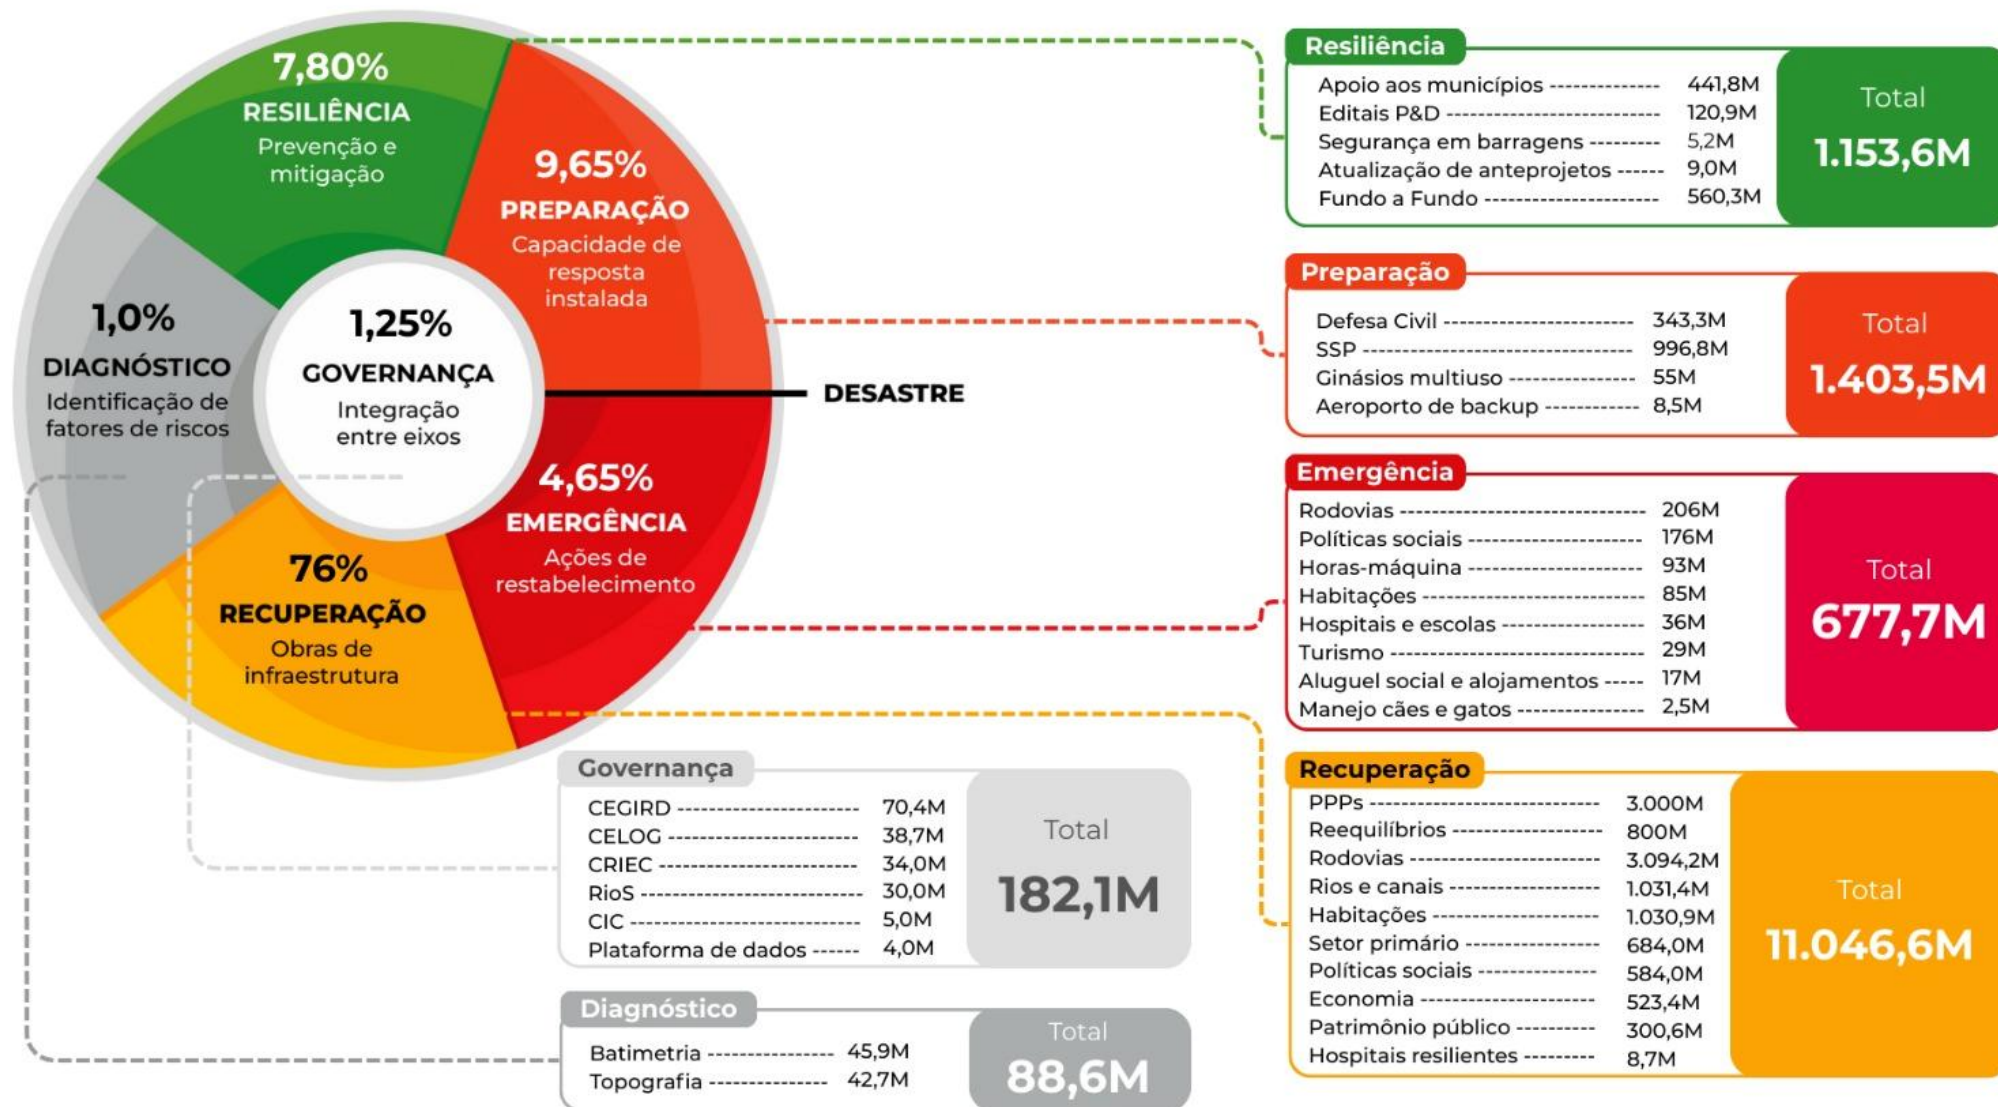



Eixo **Governança**



Centro Estadual de Gestão Integrada de Riscos e Desastres (CEGIRD)

Estrutura projetada para coordenar, monitorar e gerenciar operações de resposta a situações de emergência decorrentes de eventos extremos.

NOVO

PUBLICAÇÃO DO EDITAL PARA CONTRATAÇÃO GLOBAL DO CENTRO

- ▶ Investimento autorizado: **R\$ 70,3 milhões.**
- ▶ Prazo de execução: **12 meses.**
- ▶ Previsão de conclusão: **dez/26.**



Centro Regional de Excelência para Recuperação Resiliente (CERR)



Cooperação entre o Governo do RS e a UNDRR para implantação de uma unidade local no Rio Grande do Sul.

- ▶ **Escritório das Nações Unidas para Redução de Riscos e Desastres (UNDRR):** convoca e coordena atividades de redução visando um futuro resiliente.
- ▶ O CERR será vinculado ao CEGIRD e objetivará **fortalecer as capacidades institucionais e técnicas do Estado e dos municípios** para planejar e implementar processos de **recuperação resiliente**.
- ▶ **O que será desenvolvido no CERR:**
 - Ferramentas de avaliação da prontidão para a recuperação resiliente;
 - Planos de prontidão para recuperação, planejamento e monitoramento;
 - Estudos de caso e melhores práticas para recuperação resiliente;
 - Articulação interinstitucional e cooperação internacional com governos da região e redes relevantes;
 - Capacitação e formação de gestores municipais.



Centro de Referência Internacional em Estudos Relacionados às Mudanças Climáticas (CRIEC)

Fomento a soluções adaptativas, resilientes e mitigadoras dos efeitos das mudanças climáticas.

- ▶ Entre R\$ 1 milhão a R\$ 3 milhões por projeto, com prazo de execução de 22 meses.
- ▶ **Investimento autorizado: R\$ 34 milhões.**
- ▶ **Status: 11 projetos de pesquisa já selecionados.**

▶ **Temáticas dos projetos selecionados:**

- governança climática e gestão de riscos;
- educação, capacitação e conscientização;
- soluções baseadas na natureza e planejamento sustentável;
- monitoramento, previsão e mapeamento de riscos;
- pesquisa, inovação e tecnologias climáticas.

- ▶ **Próximas etapas:** assinatura e início da execução dos projetos até 28/11.

ASSINATURA DE DECRETO

Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil

Regulamenta a Lei nº 16.263, de 27 de dezembro de 2024, que instituiu a **Política Estadual de Proteção e Defesa Civil – PEPDEC**.

PRINCIPAIS PONTOS

- ▶ Reestruturação do **Conselho Estadual de Proteção e Defesa Civil** e suas Câmaras Temáticas.
- ▶ **Setoriais de Gestão de Riscos de Desastres** em todas as Secretarias e na PGE.
- ▶ **Gabinete Integrado de Gerenciamento de Desastres** para atuação unificada em crises.
- ▶ Centros de Gestão Integrada de Riscos e Desastres (**CEGIRD**) e de Logística Humanitária (**CELOG**).
- ▶ Procedimentos de **declaração de anormalidade**, incluindo a homologação sumária.

The background image shows the interior of a boat looking out over a calm body of water towards a distant shoreline with trees. Two people are visible from behind, wearing life jackets. A large, semi-transparent abstract graphic with overlapping green, orange, and red curved shapes is on the left side of the image.

Eixo Diagnóstico

Batimetria (1/2)

Mapeamento da profundidade e do relevo de corpos d'água.

► DESAFIO

Execução em blocos regionais, realizados por **diferentes prestadores**, utilizando **métodos distintos** frente às especificidades de cada região.


► MAPEAMENTO PIONEIRO

Realização em **escala inédita**, com tratamento **padronizado**, consistência metodológica e **banco de dados unificado** para compatibilizar as informações obtidas e possibilitar futuras **comparações históricas**.



Batimetria (2/2)

- ▶ **Investimento autorizado:**
R\$ 45,9 milhões.
- ▶ **Status: trabalho de campo iniciado em jul/2025:**
 - **Eixo Metropolitano** (Delta do Jacuí, Gravataí, Sinos e Caí): 100%;
 - **Baixo Taquari:** 58%;
 - **Baixo Jacuí:** 23%;
 - **Lago Guaíba:** 68%;
 - **Montante Jacuí e regiões litorâneas:** início em fev/2026.

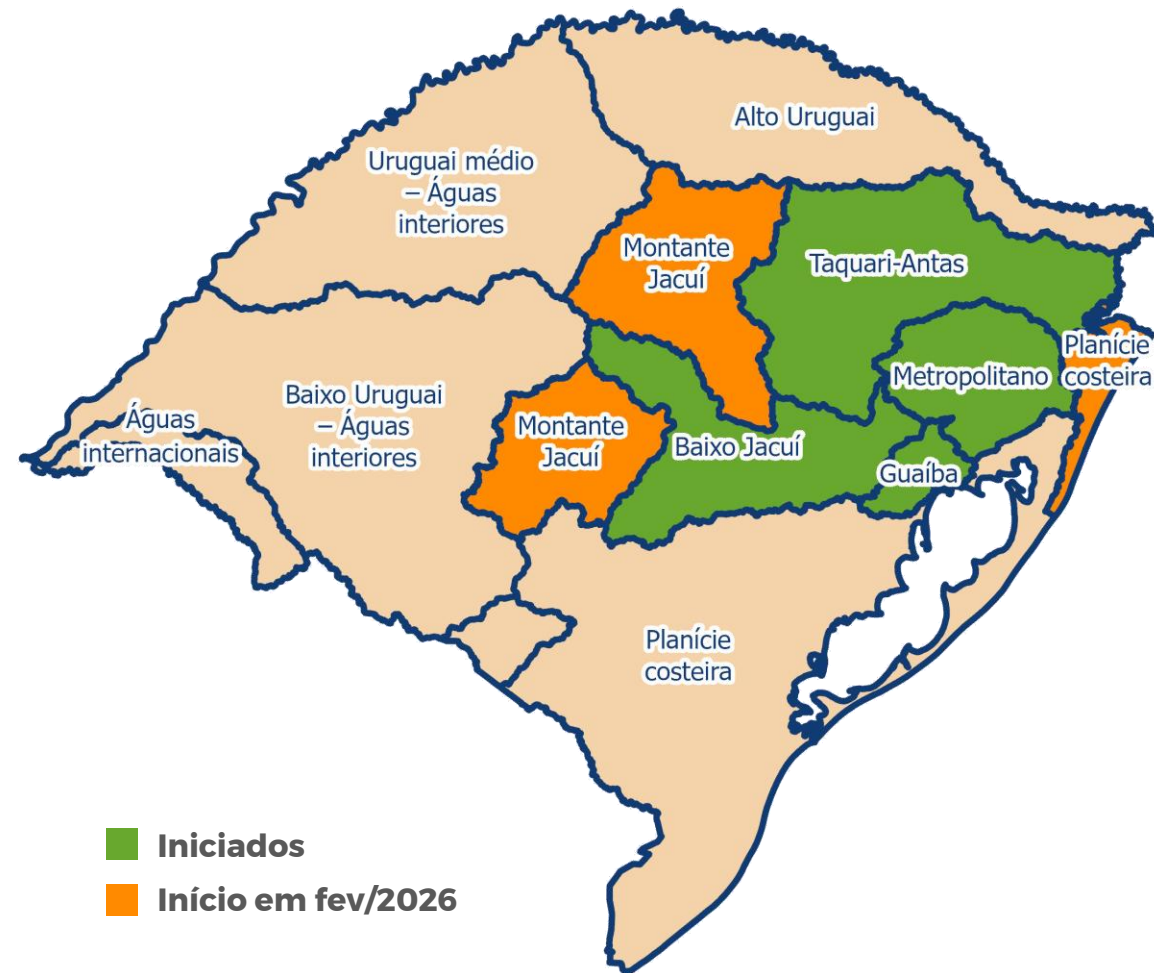


Topografia (1/2)

GOVERNO FEDERAL

Geração de Modelos Digitais de Superfície e de Terreno (MDS e MDT) e conjunto de dados geoespaciais.

- ▶ Subsídios para ações estratégicas de reconstrução, prevenção e resiliência.
- ▶ **Status: primeiros produtos entregues em set/2025.**
- ▶ ACT com Governo Federal (MIDR) para compartilhamento de dados: *em finalização.*

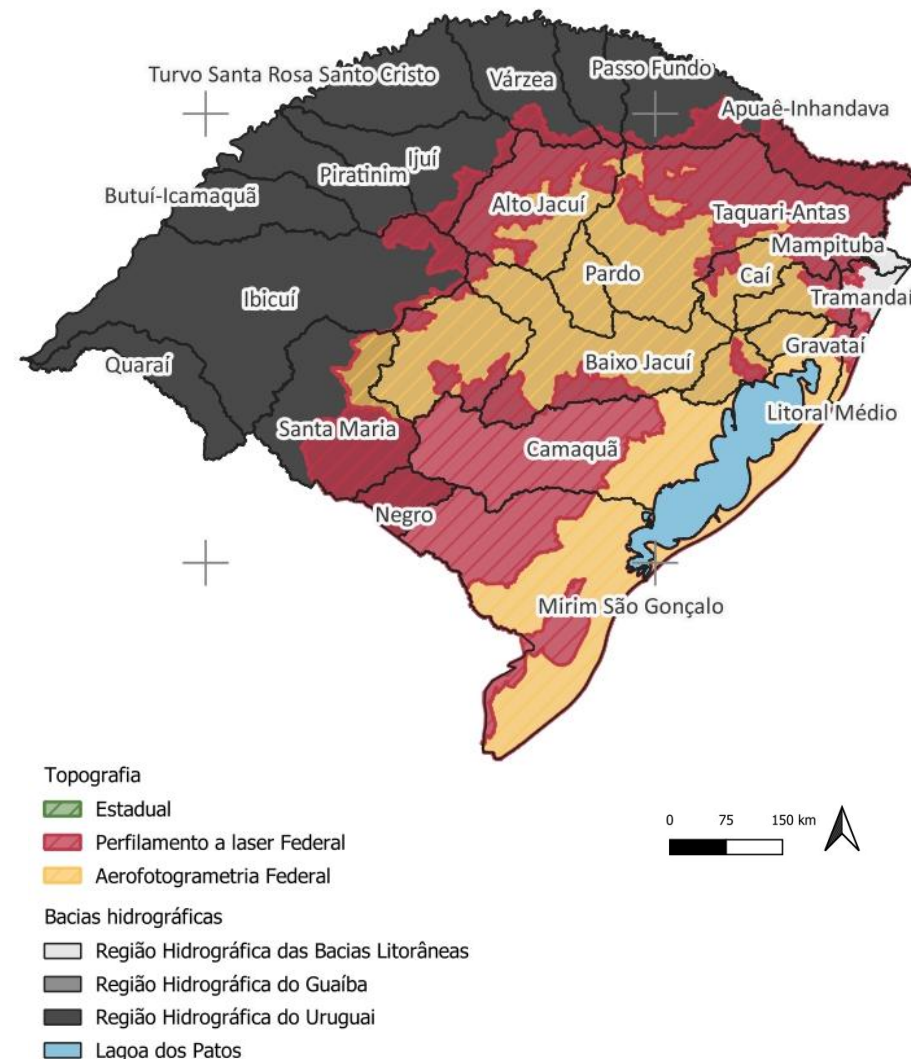


Topografia (2/2)

GOVERNO DO ESTADO

MDS e MDT a partir de aerolevantamento com tecnologia LiDAR (*Light Detection and Ranging*).

- ▶ **Investimento total: R\$ 31,45 milhões.**
- ▶ **Status: etapa de recursos na fase de homologação da contratação.**

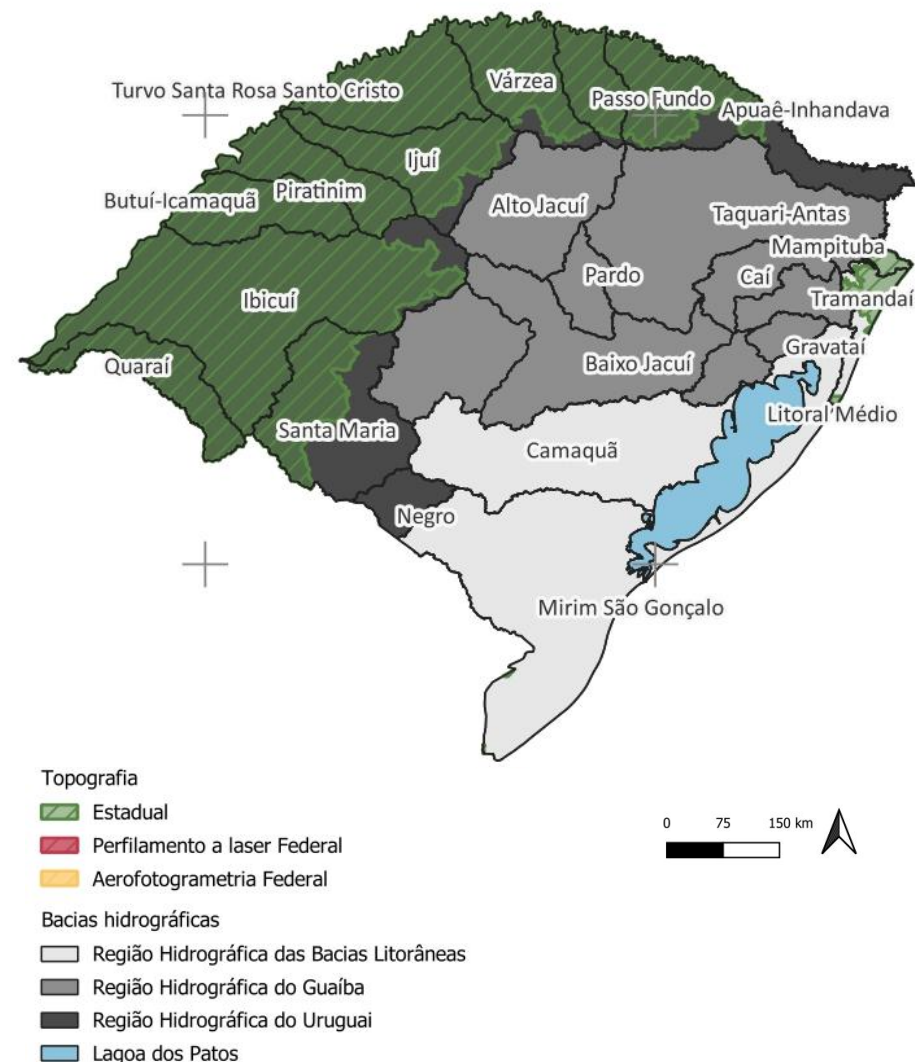

Eixo Preparação



Radares


Serviço de monitoramento meteorológico e geológico no Estado

RADAR PORTO ALEGRE (MORRO DA POLÍCIA)

- ▶ Investimento total: **R\$ 25,9 milhões.**
- ▶ Status: **instalado em set/2024.**

3 NOVOS RADARES (MANOEL VIANA, SOLEDADE E PELOTAS)

- ▶ Investimento total: **R\$ 177,7 milhões** (deságio de 28%).
- ▶ Status: assinatura do contrato **suspensa por impugnação judicial** desde o dia 10/09/2025.

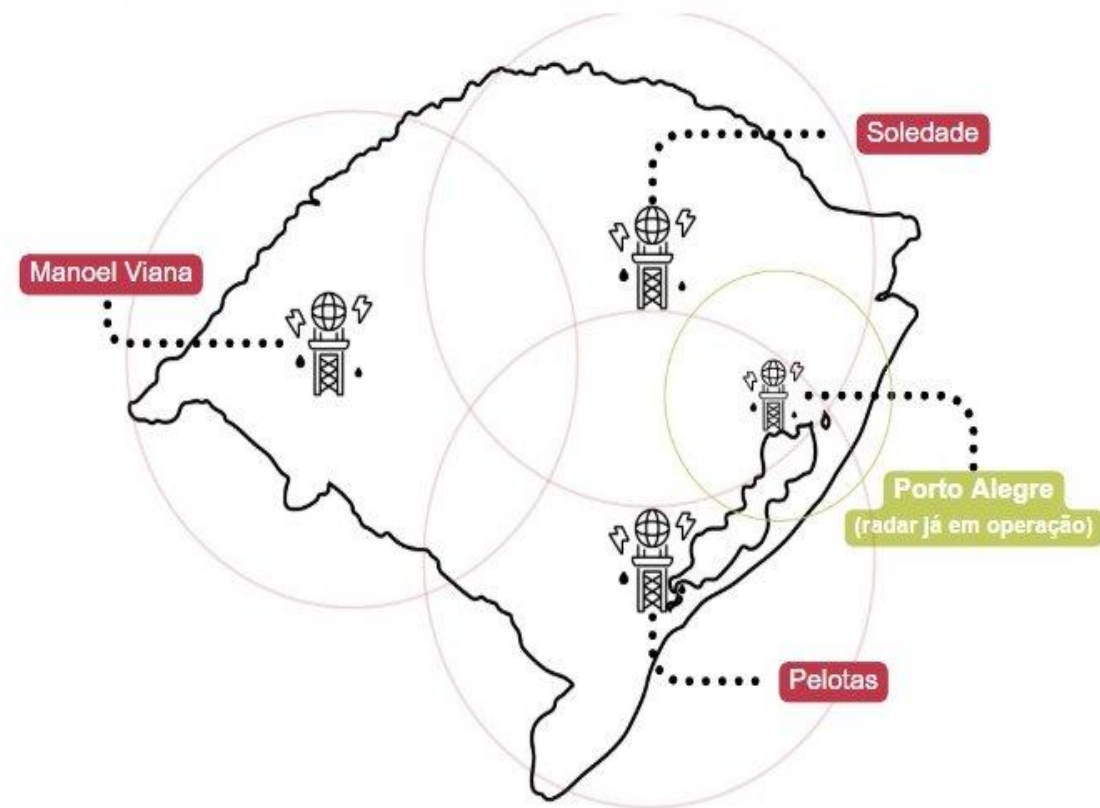


Estações Hidrometeorológicas

Instalação de 130 novas estações hidrometeorológicas.

- ▶ **Investimento total: R\$ 47,18 milhões**
- ▶ **Status: 60 estações instaladas em 45 municípios.**
Previsão de 80 estações até dez/25.



- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Bagé | 24. Picada Café |
| 2. Barão de Cotegipe | 25. Piratini/Cerrito |
| 3. Caraá | 26. Porto Alegre |
| 4. Cerro Branco/Candelária | 27. Protásio Alves/Ipê |
| 5. Charqueadas | 28. Putinga |
| 6. Coronel Bicaco | 29. Rio Grande |
| 7. Getúlio Vargas | 30. Rio Pardo |
| 8. Ibirubá | 31. Rodeio Bonito |
| 9. Igrejinha | 32. Rolante |
| 10. Imigrante | 33. Santa Maria |
| 11. Jaguarí | 34. Santa Rosa |
| 12. Maquiné | 35. São Francisco de Assis |
| 13. Marau | 36. São Lourenço do Sul |
| 14. Mata | 37. Sapiranga |
| 15. Montenegro | 38. Sarandi |
| 16. Mostardas | 39. Sinimbu |
| 17. Nova Hartz | 40. Teutônia |
| 18. Nova Palma | 41. Travesseiro/Pouso Novo |
| 19. Nova Roma/Farroupilha | 42. Três Coroas |
| 20. Nova Santa Rita | 43. Três Forquilhas |
| 21. Panambi | 44. União da Serra |
| 22. Passo Fundo | 45. Viamão |
| 23. Pelotas | |

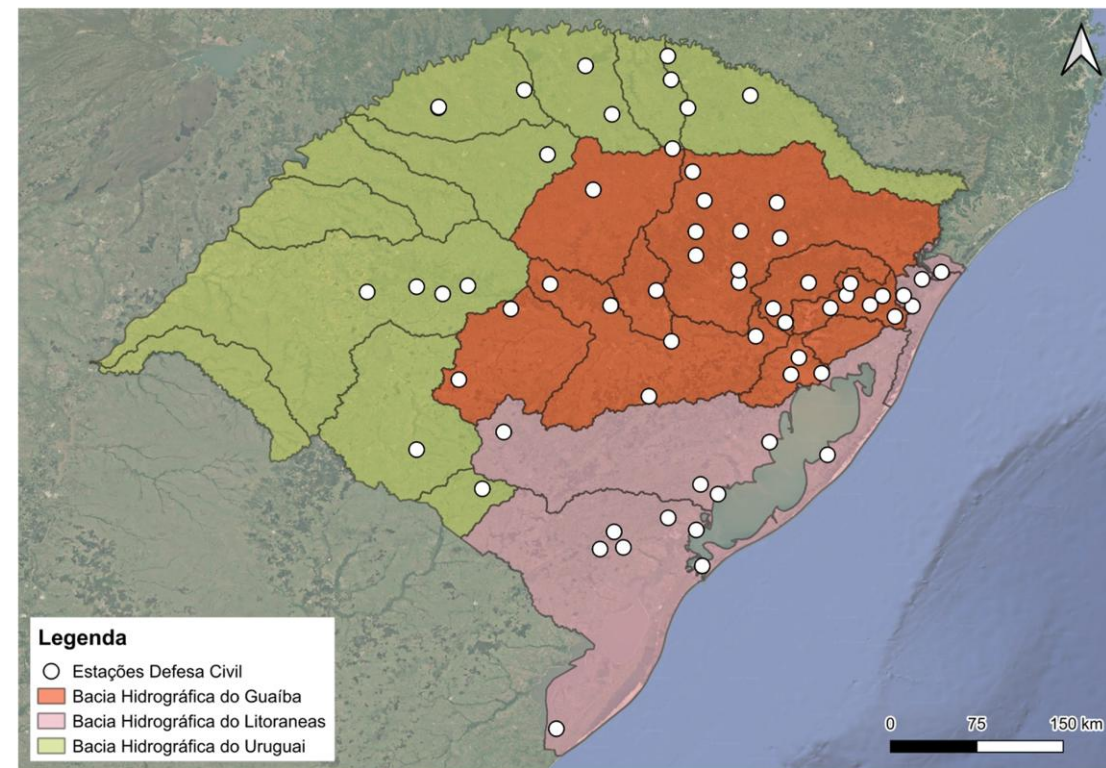

Modelagem hidrodinâmica

Autonomia para prever eventos hidrológicos críticos, identificar áreas de risco hidrológico, elaborar manchas de inundação e planejar redes de monitoramento e alerta.

- ▶ **Investimento total: R\$ 9,14 milhões.**
- ▶ **Status: entrega da mancha de inundação de 60 municípios até jan/2026.**

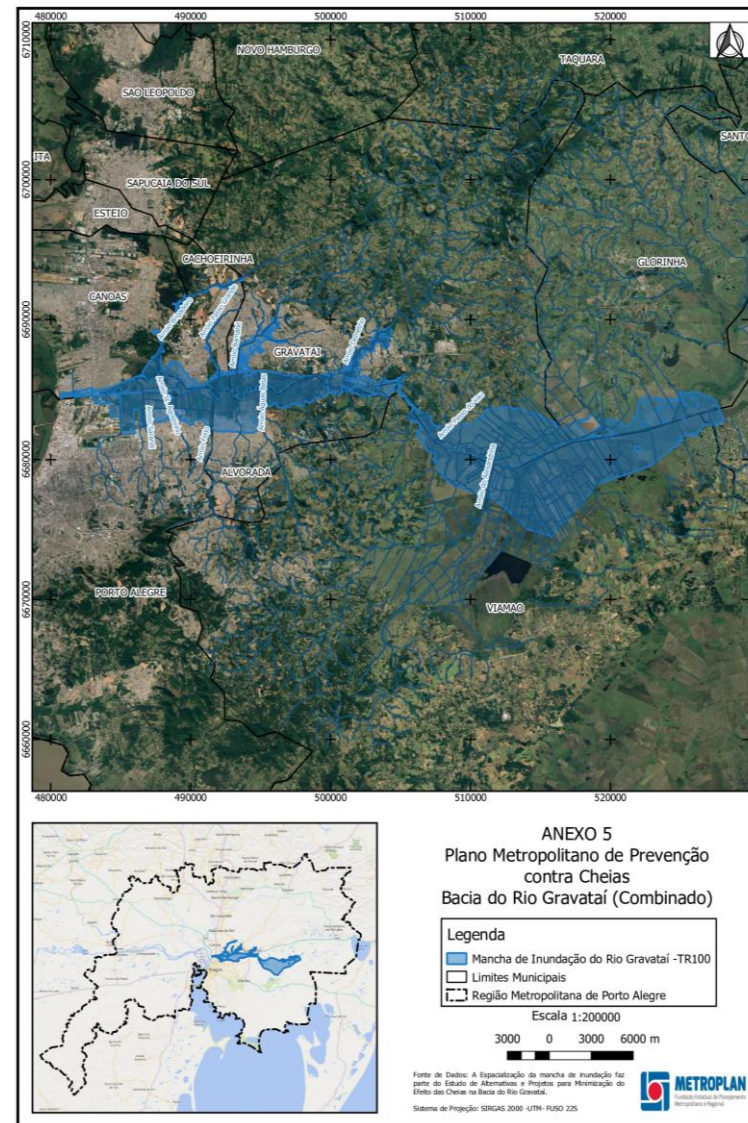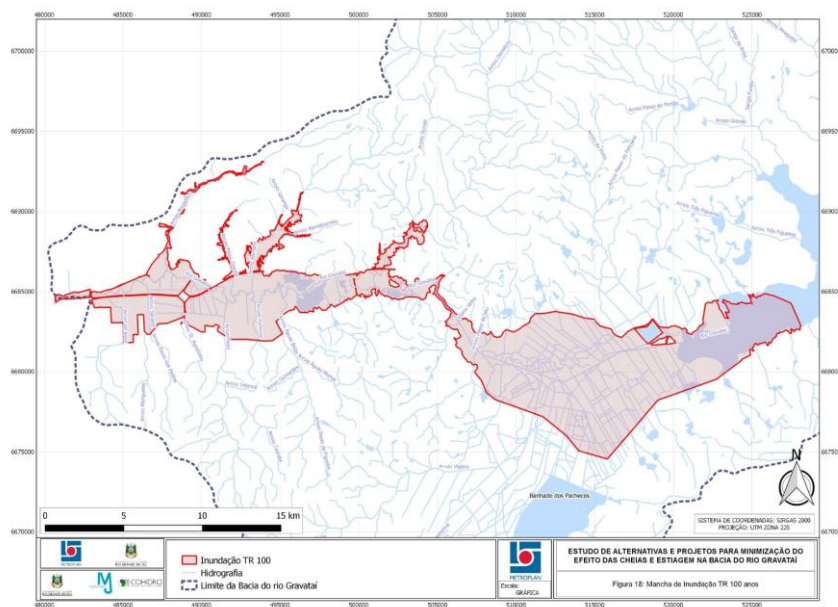




Eixo **Resiliência**

NOVO

RECURSO APROVADO NO FUNRIGS

Execução de obras de pavimentação e recapeamento de vias de acesso à Ponte Arroio do Meio x Lajeado ("Ponte do Exército")

- ▶ **Investimento autorizado:**
R\$ 14,3 milhões.
- ▶ **Prazo de execução: 12 meses.**
- ▶ **Contrapartida:** construção da ponte pelos municípios de Arroio do Meio e de Lajeado.

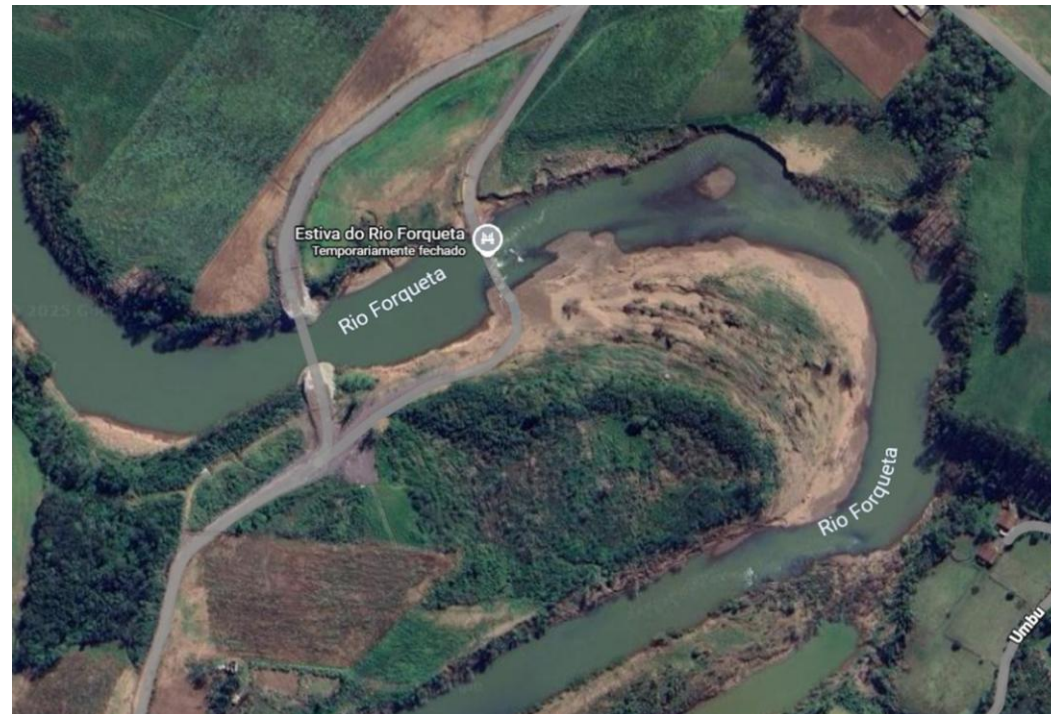

Protocolos de Emergência

Áreas prioritárias elencadas a partir de experiências anteriores da Defesa Civil:



► **Parceria com Ministério Público RS** (consultoria AECOM).

► **Status: em andamento.**

- **Assistência Social e Saúde:** primeira versão dos protocolos com as ações prioritárias já entregue. Previsão de **conclusão em dez/2025**.
- **Comunicação:** levantamento das ações prioritárias **em elaboração**.
- **Logística:** em estruturação e análise **inicial** dos protocolos.

Planos de Contingência das Escolas (PLANCON Escolar)

- ▶ Iniciativa coordenada pela SEDUC, em parceria com a Defesa Civil Estadual, o Instituto Alana e o movimento Vozes da Educação.
- ▶ **Status:**
 - **Guia para Elaboração de Planos de Contingência Escolares para Eventos Climáticos** lançado em out/25.
 - **Elaboração** dos planos **já iniciada** em **87 escolas** consideradas mais vulneráveis, de acordo com estudo realizado pela SEDUC e pelo Banco Mundial.
 - Previsão de **conclusão** desses planos **até jul/2026**
 - Implementação acompanhada pela UNESCO, em articulação com a equipe técnica da SEDUC.

Acesse aqui:

[guia-plancon-escolar.pdf](#)



Planos Diretores Municipais

Acompanhamento para revisão das diretrizes de uso do solo, infraestrutura e construção, levando em consideração as vulnerabilidades específicas de cada município.

- ▶ Convênio com a Univates.
- ▶ **Sete municípios** contemplados:
 1. Encantado
 2. Estrela
 3. Colinas
 4. Cruzeiro do Sul
 5. Roca Sales
 6. Muçum
 7. Arroio do Meio

▶ **Investimento total: R\$ 3,1 milhões**

▶ **Status:**

- **Audiências Públicas finalizadas em nov/2025.**
- **Conclusão das minutas** dos Planos Diretores de Desenvolvimento Urbano: **jan/2026.**
- **Entregas finais** e conclusão do contrato **mar/2026:**
 1. Diretrizes para Parcelamento do Solo
 2. Diretrizes para Mobilidade
 3. Diretrizes para Habitação Social
 4. Diretrizes para o Código de Obras e Edificações

Sistema de Proteção Contra Cheias


Atualização dos anteprojetos.

BACIA DO BAIXO JACUÍ (ELDORADO DO SUL)

- Investimento total: **R\$ 3,75 milhões.**
- Status: serviços **em execução desde ago/2025**. Entrega dos resultados prevista para jan/2026.

SUB-BACIA DO ARROIO FEIJÓ (ALVORADA E PORTO ALEGRE)

- Investimento autorizado: **R\$ 5,2 milhões.**
- Status: licitação em andamento. Recebimento das **propostas até 28/11/25.**

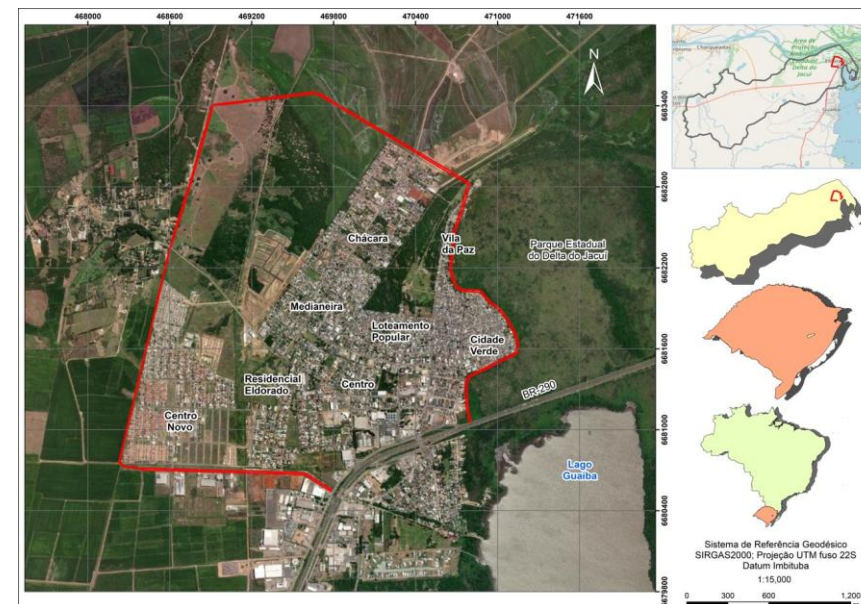

Conexões RS

Investimento em pontes, pontilhões, galerias e passagens molhadas.

- ▶ Até R\$ 1 milhão por município.
- ▶ **Investimento autorizado: R\$ 200 milhões.**
- ▶ **Status: 330 municípios enviaram propostas.**
Divulgação dos resultados: dez/2025.

Drenagem RS

Investimento em obras de microdrenagem e galerias.

- ▶ Até R\$ 2,5 milhões por município.
- ▶ **Investimento autorizado: R\$ 150 milhões.**
- ▶ **Status: 256 municípios enviaram propostas.**
Divulgação dos resultados: dez/2025.



Fundo a Fundo Reconstrução

DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS APOIADAS:

- ▶ Modernização de casas de bombas (EBAPs, EBEs e EBABs)
- ▶ Recuperação de diques
- ▶ Recuperação, substituição e fechamento de comportas
- ▶ Contratação de estudos hidrológicos
- ▶ Anteprojeto de sistemas de proteção contra cheias
- ▶ Elaboração de Plano Diretor de Drenagem Urbana (PDDrU)
- ▶ Microdrenagem e macrodrenagem urbana
- ▶ Hidrojateamentos
- ▶ Levantamento e cadastramento de redes

Município	Valor aprovado (R\$ milhões)	Valor já repassado (R\$ milhões)
Canoas	179,7	62,8
Porto Alegre	171,6	60
Eldorado do Sul	23,7	14
Pelotas	13	0
Gravataí	11,4	5,7
Nova Hamburgo	2,8	2,8
Rio Grande	1,2	1,2
Total	403,4	147,7

ASSINATURA

FAF RECONSTRUÇÃO

Termos de Compromissos com novos municípios

Sapucaia do Sul R\$ 6,5 milhões

Limpeza e hidrojateamento de 234.928 metros de rede e desobstrução de bocas de lobo e poços de visita.

Esteio R\$ 3,5 milhões

Serviço de hidrojateamento, limpeza e reabilitação funcional em 124.752,66 metros de rede.

São Sebastião do Caí R\$ 2,4 milhões

Serviço de limpeza e hidrojateamento em 69.321 metros de rede urbana.

- ▶ **Total autorizado: R\$ 416,1 milhões**
- ▶ **Total repassado: R\$ 147,7 milhões**



Eixo Recuperação

Habitação

A Casa é Sua - Calamidades

- ▶ **Valor autorizado: R\$ 702,7 milhões**
 - **R\$ 83,8 milhões** - 520 unidades habitacionais temporárias em 10 municípios - entregue
 - **R\$ 170,2 milhões** - desapropriações, aquisições e infraestrutura de novos loteamentos (Vale do Taquari e Eldorado do Sul) - em andamento
 - **R\$ 448,3 milhões** - aquisição de 2.681 casas definitivas em 67 municípios - em andamento

Mais de 3.300 famílias diretamente beneficiadas.

Porta de Entrada

Subsídio de até R\$ 20 mil por família para a entrada na compra da casa própria.

- ▶ **Valor autorizado: R\$ 267,5 milhões**
- ▶ **Status:**
 - **Fase 1 (concluída):**
mais de 6.000 famílias beneficiadas
 - **Fase 2 (em andamento):**
mais 7.500 famílias

Rodovias e pontes

► Investimento autorizado: R\$ 2,8 bilhões

- Recuperação de 806,3 km de rodovias;
- 8 pontes;
- Rodovias de resiliência (ERS-118, ERS-373, ERS-101 e ERS-348);
- 2 contratos de Assistência Técnica.


► Status: 34 lotes aprovados

- 4 com obras **em andamento**;
- 4 com **início em dez/25**;
- Lotes com previsão de **início 2026**:
 - **23 lotes** no 1º trim.
 - **3 lotes** no 2º trim.
- Lotes **em contratação**:
 - **5** em fase de publicação de **chamamento**.
 - **2** com **recursos administrativo**.

Rodovias Funrigs (vermelho recuperação, azul resiliência)



Bloqueios

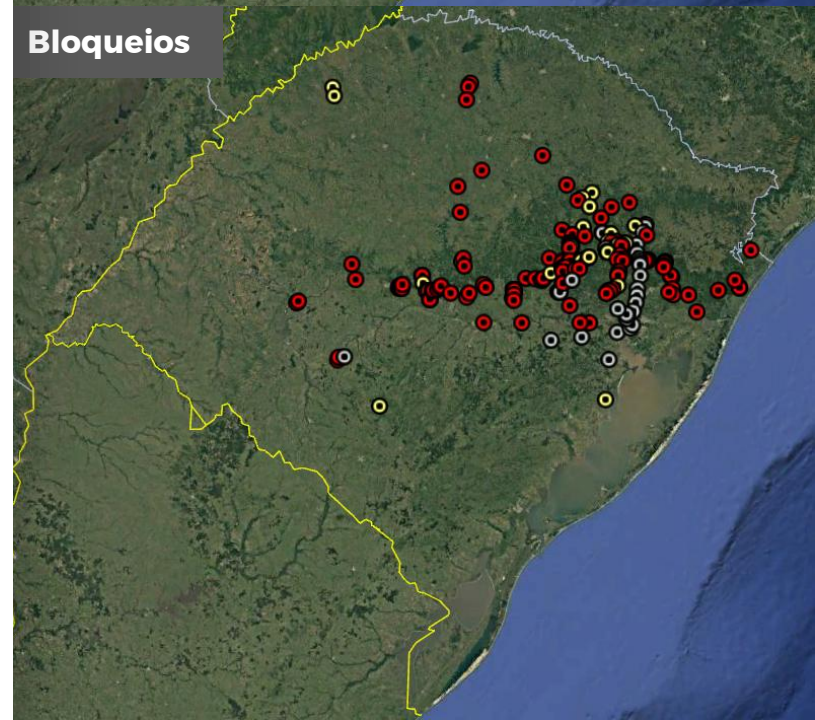

Rodovias e pontes: contratação integrada emergencial

	Fase atual (%)																					Previsão de conclusão
Lotes	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	
Lote 1 - ERS 332: Encantado a Anta Gorda R\$ 93,1 mi	Elaboração de Projeto Básico e Executivo																					Junho de 2027
Lote 2 - ERS 332: Anta Gorda a Soledade R\$ 107,2 mi	Elaboração de Projeto Básico e Executivo																					Setembro de 2026
Lote 3 - ERS 431: Bento Gonçalves a São Valentim do Sul R\$ 101 mi	Elaboração de Projeto Básico e Executivo																					Abril de 2027
Lote 4 - ERS 444: Monte Belo do Sul a Santa Tereza R\$ 92 mi	Elaboração de Projeto Básico e Executivo																					Junho de 2027
Lote 5 - ERS 448: Nova Roma do Sul a Rio das Antas R\$ 55.2 mi	Elaboração de Projeto Básico e Executivo																					Setembro de 2026
Lote 6 - ERS 448: Rio das Antas a Farroupilha R\$ 62.9 mi	Elaboração de Projeto Básico e Executivo																					Setembro de 2026
Lote 7 - ERS 452: Feliz a Vale Real R\$ 51.8 mi	Elaboração de Projeto Básico e Executivo																					Agosto de 2026
Lote 8 - ERS 826: Feliz a Alto Feliz R\$ 52.9 mi	Elaboração de Projeto Básico e Executivo								Obras em andamento													Junho de 2026
Lote 9 - ERS 129: Estrela a Roca Sales R\$ 56 mi	Elaboração de Projeto Básico e Executivo					Obras em andamento																Dezembro de 2026
Lote 10 - ERS 149: Nova Palma a São João do Polêsine R\$ 79.1 mi	Elaboração de Projeto Básico e Executivo																					Junho de 2027

Rodovias e pontes: contratação integrada emergencial

	Fase atual (%)																					Previsão de conclusão
Lotes	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	
Lote 11 - ERS 348: Agudo a Dona Francisca R\$ 169,8 mi	Elaboração de Projeto Básico e Executivo																					Setembro de 2026
Lote 12 - ERS 348: São João do Polêsine a Dona Francisca R\$ 33,2 mi	Elaboração de Projeto Básico e Executivo							Obra em andamento														Junho de 2026
Lote 13 - ERS 437: Vila Flores a Rio das Antas R\$ 61,9 mi	Elaboração de Projeto Básico e Executivo																					Junho de 2027
Lote 14 - ERS 437: Rio das Antas a Antônio Prado R\$ 68,3 mi	Elaboração de Projeto Básico e Executivo																					Junho de 2027
Lote 15 - ERS 640: Cacequi a Rosário do Sul R\$ 98,2 mi	Elaboração de Projeto Básico e Executivo							Obra em andamento														Junho de 2026
Lote 16 - ERS 415: Bom Princípio a Tupandi R\$ 23,7 mi	Elaboração de Projeto Básico e Executivo																					Março de 2027
Lote 17 - ERS 486: Tainhas a Terra de Areia R\$ 130,6 mi	Elaboração de Projeto Básico e Executivo																					Junho de 2027
Lote 18 - ERS 433: Relvado R\$ 77,6 mi	Projeto Básico e Executivo																					Abril de 2027
Lote 19 - ERS 431: Dois Lajeados a São Valentim do Sul R\$ 84,8 mi	Projeto Básico e Executivo																					Abril de 2027

Rodovias e pontes: contratação integrada emergencial

	Fase atual (%)																					Previsão de conclusão
Lotes	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	
Lote 20 - ERS 453: Caxias do Sul a Lajeado Grande R\$ 136,7 mi	Elaboração de Projeto Básico e Executivo																					Outubro de 2026
Lote 21 - ERS 453: Lajeado Grande a Tainhas R\$ 113,6 mi	Elaboração de Projeto Básico e Executivo																					Outubro de 2026
Lote 22 - ERS 840: Ivoti a Lindolfo Collor R\$ 14,7 mi	Elaboração de Projeto Básico e Executivo																					Outubro de 2026
Lote 23 - ERS 873: Morro Reuter a Santa Maria do Herval R\$ 39,9 mi	Projeto Básico e Executivo																					Abril de 2027
Lote 24 - ERS 020: Gravataí a Três Coroas R\$ 78,8 mi	Recurso adm.																					Outubro de 2027
Lote 25 - ERS 020: Gravataí a Três Coroas R\$ 72,8 mi	Recurso adm.																					Outubro de 2027
Lote 26 - ERS 020: Gravataí a Três Coroas R\$ 63,8 mi	Projeto Básico e Executivo																					Outubro de 2027
Lote 27 - ERS 425: Nova Bréscia R\$ 43,5 mi	Projeto Básico e Executivo																					Outubro de 2026
Lote 28 - ERS 373: Gramado R\$ 19,3 mi	Projeto Básico e Executivo																					Outubro de 2026
Lote 29 - VRS 858: Candelária R\$ 55,3 mi	Projeto Básico e Executivo																					Abril de 2027

Rodovias e pontes: contratação integrada emergencial

	Fase atual (%)																					Previsão de Conclusão
Lotes	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	
Lote 30 - ERS 124: Harmonia a São Sebastião do Caí R\$ 55 mi	Contratação																					Junho de 2027
Lote 31 - RSC 453: Westfália a Imigrante R\$ 17,7 mi	Contratação																					Maio de 2026
Lote 32 - ERS 355: Vila Flores a Fagundes Varela R\$ 58,8 mi	Contratação																					Junho de 2027
Lote 33 - ERS 305: Crissiumal R\$ 29,2 mi	Contratação																					Maio de 2026
Lote 34 - ERS 241: São Francisco de Assis a São Vicente do Sul R\$ 81,6 mi	Contratação																					Junho de 2027

Rota de Santa Maria (RSC-287)

Reequilíbrio do contrato de concessão para viabilizar obras de reconstrução com resiliência.

- ▶ **Parcela inicial autorizada: R\$ 110 milhões**
- ▶ **Status:**
 - **Ponte sobre o Arroio Barriga: obras iniciadas** em set/2025. Prazo de execução: 6 meses.
 - **Ponte sobre Arroio Grande: obras iniciadas** em set/2025. Prazo de execução: 13 meses.
 - **Candelária: obras iniciadas** em nov/25. Prazo de execução: 15 meses.
 - **Mariante:** projeto executivo em **análise final**. Prazo de execução: 19 meses após aprovação.

Arroio Grande



Arroio Barriga



Caminhos da Serra Gaúcha (Bloco 3)

Reequilíbrio do contrato de concessão para viabilizar obras de resiliência nas rodovias.

- ▶ **Fase 1:** despesas extraordinárias para **liberação** ágil das rodovias após o evento climático, não cobertas pelo seguro devido à magnitude do desastre.
 - ▶ **Status:** em análise final na SERG.
- ▶ **Fase 2:** obras não previstas no Plano de Exploração Rodoviária (PER), mas necessárias após o evento climático de 2024 para reforçar a **resiliência** da infraestrutura.
 - ▶ **Parcela inicial** autorizada pela AGERGS em 26/10/25: **R\$ 86,3 milhões.**



Dragagem de hidrovias (Portos RS)

► Investimento autorizado: **R\$ 731,3 milhões**

► Status:

- **Lote 1** - Canal do Itapuã: **concluído**.
- **Lote 2** - Leitão, Pedras Brancas, e Furadinho: **concluído**.
Barra de São Gonçalo: **em andamento**.
- **Lote 3** - Feitoria: **em andamento**.
- **Lote 4** - Canal do Porto de Rio Grande: **em andamento**.
- **Lote 5** - Canais Campista, Junco, Belém, Cristal, Navegantes, Gravataí/Humaitá, Rio das Balsas e Cais Porto Alegre: **homologação da licitação**.
- **Lote 6** - Canal da Seita, Coroa do Meio e Nascimento: **homologação da licitação**.
- **Lote 7** - Canal Foz do Gravataí, Gravataí Gás/Saco do Cabral, Rio Caí e Rio dos Sinos: **preparação para a licitação**.



Hidrogênio Verde (H2V)

Fomento a soluções inovadoras que contribuam para a viabilização da produção, transmissão, armazenamento e uso de hidrogênio verde no estado, dentro de uma estratégia de descarbonização.

- ▶ **Investimento total: R\$ 102,4 milhões.**
- ▶ **Status: 4 projetos selecionados para subvenção.**

EMPRESA	PROJETO
Âmbar Sul Energia S/A	Produção de H2V a partir de energia solar fotovoltaica
Tramontina	Produção de H2V por eletrólise da água
Rodoplast	Produção de H2V integrada na gestão de resíduos sólidos urbanos (RSU)
B&8 Energy S.A (assinatura na COP 30)	Posto de abastecimento de H2V para caminhões extrapesados, produzido a partir do Etanol

Âmbar
ENERGIA

T TRAMONTINA

Rodoplast

Be8

Espaço para manifestações



PLANO RIO GRANDE

**A nossa obra é
proteger você**

Obrigado

Eduardo Leite

Governador do Estado do Rio Grande do Sul

Gabriel Souza

Vice-Governador do Estado do Rio Grande do Sul

 /governodoRS

 @governo_rs

 @governo_rs

 /governors

rs.gov.br



GOVERNO
DO ESTADO
**RIO
GRANDE
DO SUL**
O futuro nos une



REUNIÃO

CONSELHO DO PLANO RIO GRANDE

27 DE NOVEMBRO DE 2025

